

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 20140620 11809
Datum van verslag: 20/06/2014
Datum van onderzoek: 4 4
U. ref.:
O. ref.:
Stroomleverancier: Eandis
Ref.:
Teller nr.:
Index:

ADRES INSTALLATIE: Klokke Roelantlaan 11b
9112 Sint-Wal
EIGENAAR: Tom Van Broeckhoven
Adres:
OPDRACHTGEVER: Eandis
Adres:
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW OF IK:

Aard van het onderzoek: ☒ gelijkvormigheidsonderzoek ☐ controlebezoek volgens:

☒ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☒ (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: ☒ Nieuwe ☒ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring

Aard van de locatie: LS 2000/0000

Omschrijving aansluiting: ☐ Ondergronds ☐ Bovengronds

Type van aardelektrode: ☒ Lus ☐ Baren ☐ Pennen

Voedingskabel hoofdbord: 3 X 4 mm²

Bescherming van de aansluiting: 25 A

Aansluiting: Spanning: 2000/3000/000 V

Alg. schakelaar: type: Duff/3000/140/1/45

Elektrische installatie: ☐ V60r ☒ Na ☒ 1.10.81 ☐ 1.1.83 ☒ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☐ AREI art.89 ☐ AREI art.90 ☐ AREI art.91 ☐ AREI art.92 ☐ AREI art.93 ☐ AREI art.94 ☐ AREI art.95 ☐ AREI art.96 ☐ AREI art.97 ☐ AREI art.98 ☐ AREI art.99 ☐ AREI art.100

Aantal borden: 1

Aantal eindstroombanen: 1

RA: 3,5 Ohm

RI tot 0,5 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema (s) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

Aud 25A 7P -> 564 -> Power One PUI 5000 TL -> 2 strings Getal 22x 750 w P
SV: 068 773
Teller Gexel Gavoni EN10 DIN
SW: B108050 W
Tellerstand: 471
MID: OK
P15 114 5000 watt.

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:

Geen inbreuken

7

Notitie: De leiding is enkel gelijkt voor de geplaatste rommelpalen door Eandis

Besluit:

☒ A

De installatie is conform. ~~De algemene DS werd verzegeld.~~ De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 20/06/2039 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

B.

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform

C.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR


PRINCIPESHEMA

Projectnr: *LUXWOOD*

Naam klant: *Tom Van Broekhoven*

Adres: *Kloede Roelandlaan 18B*

Gemeente: *9112 Sint-Niklaas*

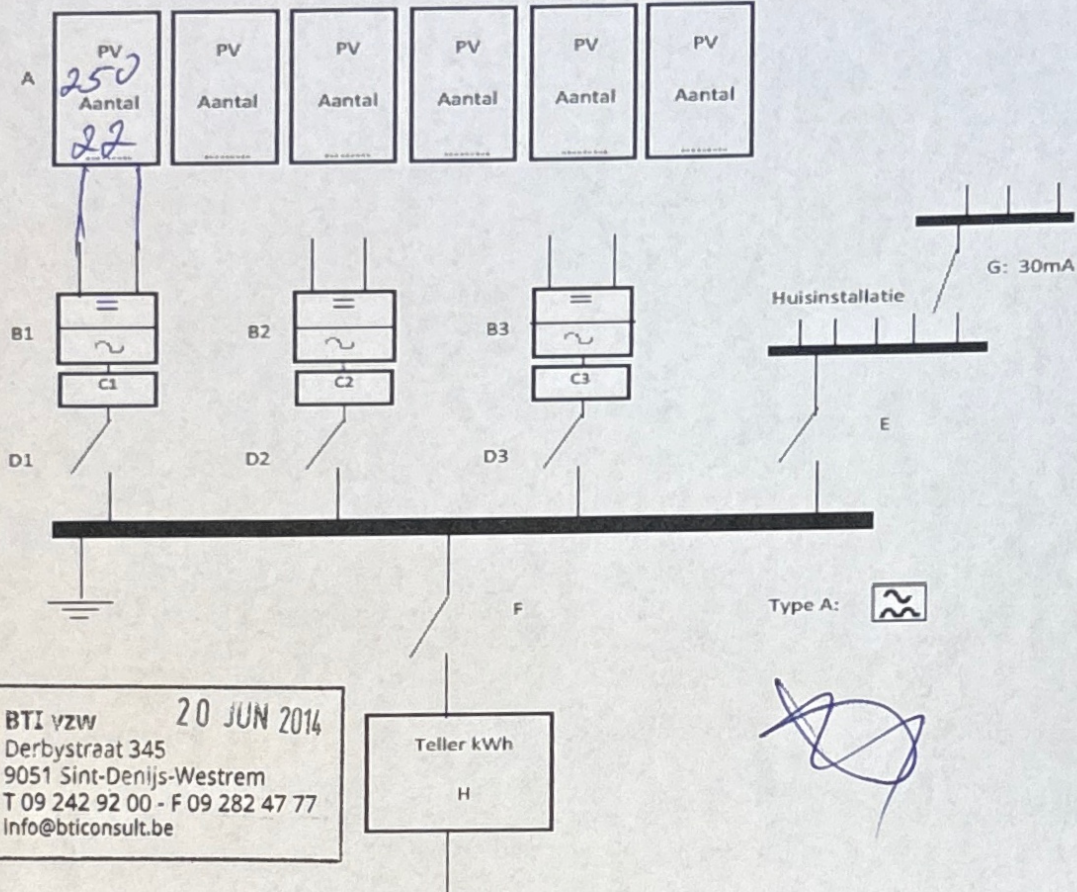

BTI vzw
Derbystraat 345
9051 Sint-Denijs-Westrem
T 09 242 92 00 - F 09 282 47 77
Info@bticonsult.be

20 JUN 2014

Teller kWh
H

A	PV panelen	2X 11 x 2500 Wp		
B1	Omvormer 1	Type: POWER ONE	Serienr: 1321068223 VR21P	AC max: 25 A
B2	Omvormer 2	Type:	Serienr:	AC max: A
B3	Omvormer 3	Type:	Serienr:	AC max: A
C1	Energieteller 1	Serienr: B108050N	Meterstand:	
C2	Energieteller 2	Serienr:	Meterstand:	
C3	Energieteller 3	Serienr:	Meterstand:	
D1	Automaat	25 A		
D2	Automaat	A		
D3	Automaat	A		
E	Automaat	A		
F	Verliesstroomschak.	40 A 300 mA		
G	Verliesstroomschak.	A mA		
H	Facturatie teller	Meterstand:		
